


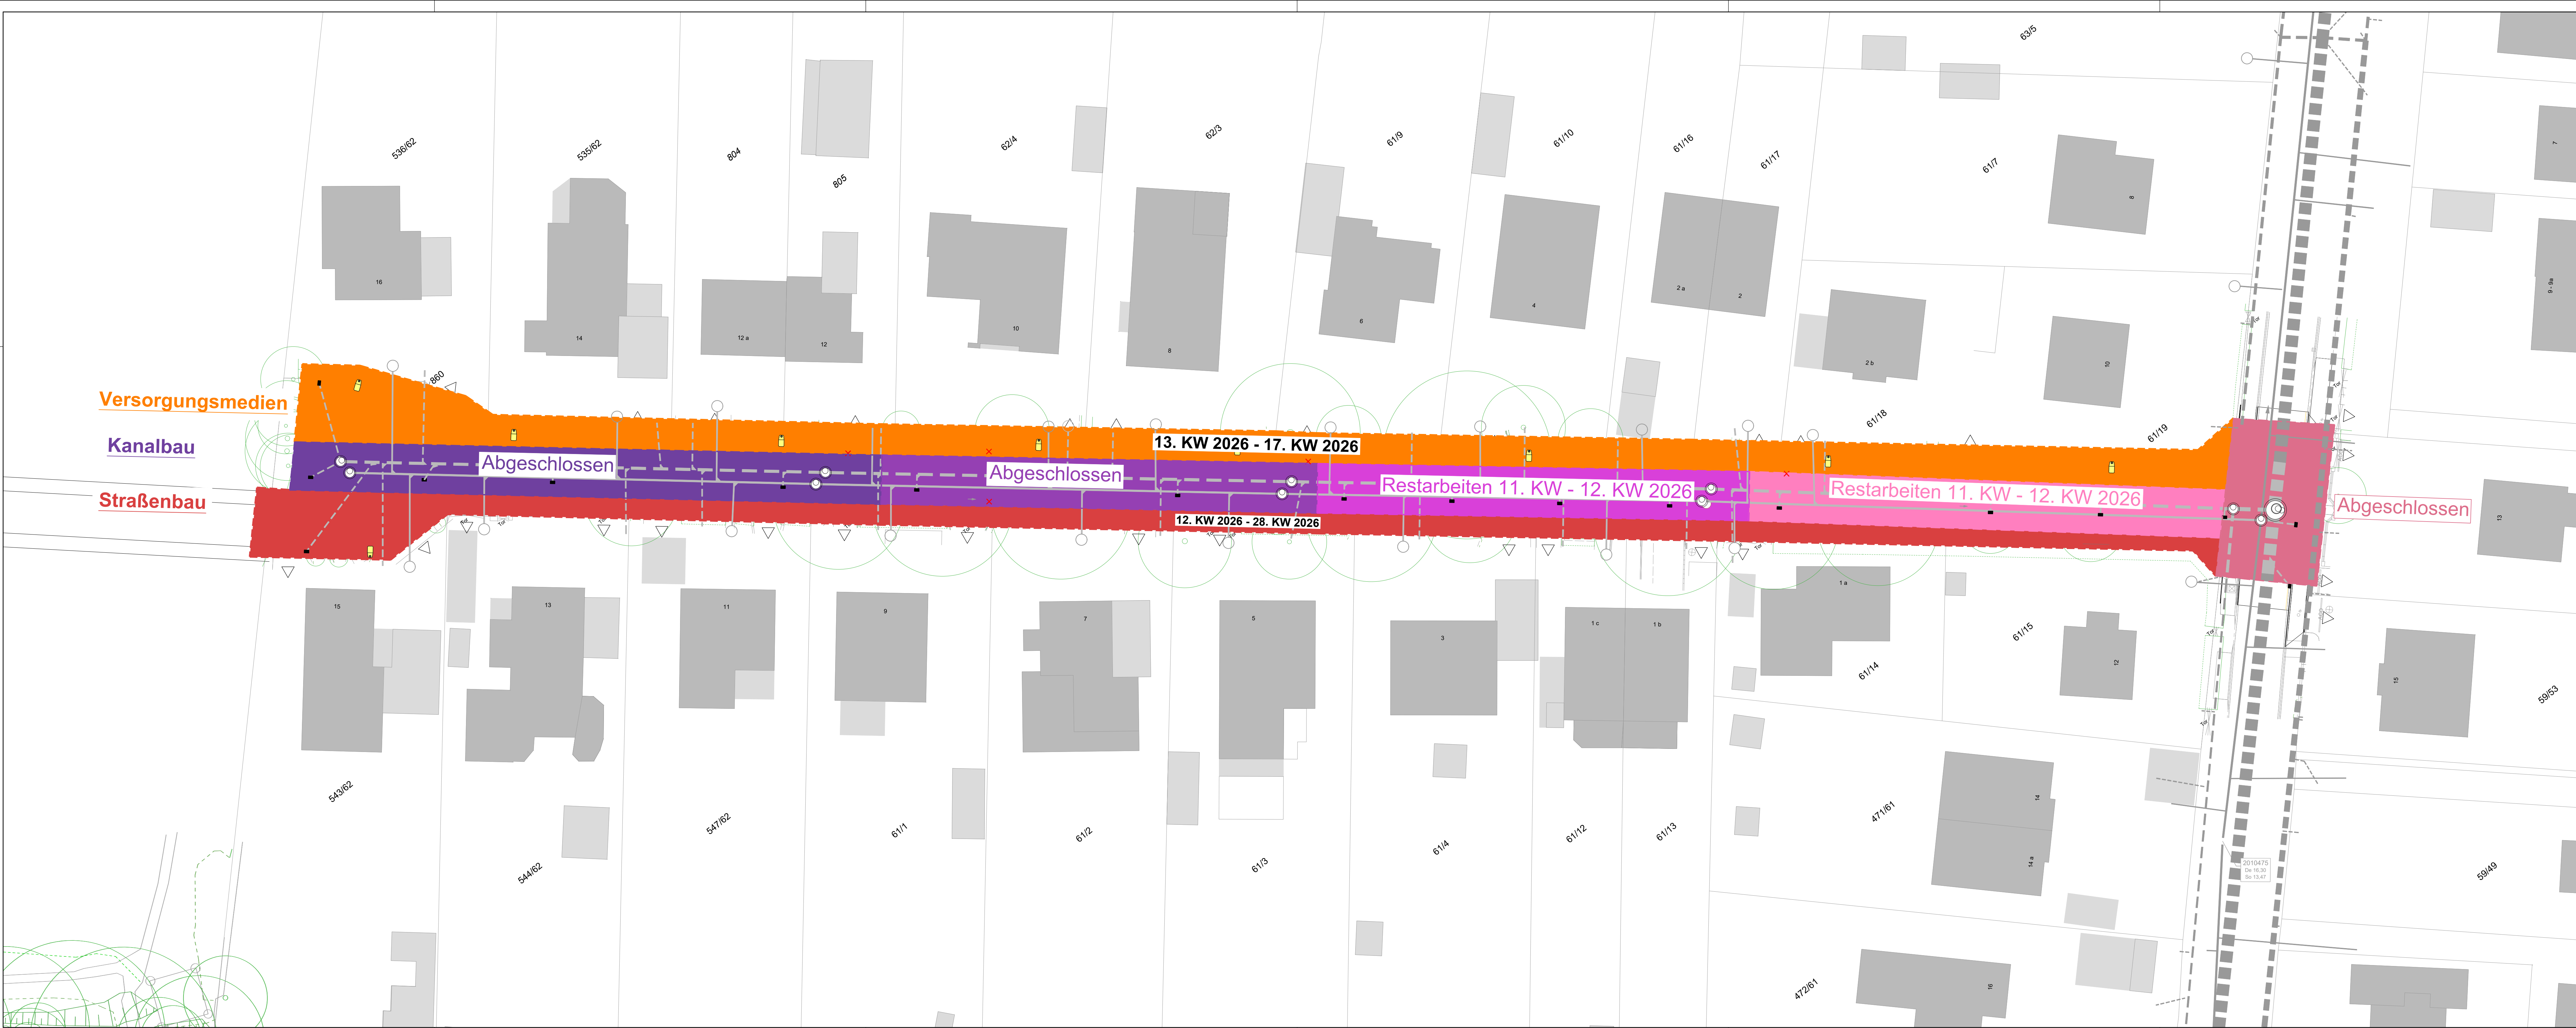

- Zeichenerklärung:**
- gepl. Regenwasserkanal inkl. Schacht und Schachtdeckel
 - vorh. Regenwasserkanal mit Schacht
 - gepl. Schmutzwasserkanal inkl. Schacht und Schachtdeckel
 - vorh. Schmutzwasserkanal mit Schacht
 - gepl. Anschlussleitung Regenwasserkanal
 - vorh. Anschlussleitung Regenwasserkanal
 - gepl. Anschlussleitung Schmutzwasserkanal
 - vorh. Anschlussleitung Schmutzwasserkanal
 - vorh. / gepl. Beleuchtung
 - Flurstückennummer
 - Hausnummer
 - vorh. Baum
 - gepl. / vorh. / entf. Straßenablauf

- gepl. Bauphasen:**
- gepl. Bauphase 1, Kanalbau einschl. Oberflächen: Abgeschlossen
 - gepl. Bauphase 2, Kanalbau: Restarbeiten 11. KW bis 12. KW 2026
 - gepl. Bauphase 3, Kanalbau: Restarbeiten 11. KW bis 12. KW 2026
 - gepl. Bauphase 4, Kanalbau: Abgeschlossen
 - gepl. Bauphase 5, Kanalbau: Abgeschlossen
 - gepl. Bauphase Versorgung: 13. KW 2026 bis 17. KW 2026
 - gepl. Bauphase Straßenbau: 12. KW 2026 bis 28. KW 2026

Hinweis:
Der vorliegende Plan dient lediglich der Übersicht. Die Lage der vorh. Kabel bzw. Leitungen sind nachrichtlich aus den Unterlagen der Versorgungsträger übernommen worden. Vor Beginn der Baumaßnahme sind die Versorgungsträger zu informieren und die aktuellen Bestandspläne abzufragen. Für die Feststellung der genauen Lage der Kabel bzw. Leitungen sind gegebenenfalls Suchschlitze durchzuführen. Die Kabel- und Leitungsschutzanweisungen der einzelnen Versorgungsunternehmen sind zu beachten. Die Trassen der gepl. Versorgungsmedien dienen lediglich der Übersicht und sind nicht maßstäbgetreu. Die genauen Maße entnehmen Sie bitte den Querschnitten.

Anmerkung
Die Darstellung der Schächte ist nicht maßstäblich.

Planungsgrundlage:
ALKIS-Daten der Gemeinde Halstenbek
im Bezugssystem ETRS89 UTM32N
zur Verfügung gestellt vom Kreis Pinneberg,
zentrale GDI-SH-Stelle, Kurt-Wagener-Straße 11, 25337 Elmshorn

Index	Datum	Art der Änderungen	Gezeichnet
-03	20.06.2025	Einbearbeitung der Teilungsvermessung vom 24.02.2025 sowie Anpassung der Flurstückennummern	AI / E.H.
-02	10+12.07.2024	Erstellung der Expositionsmap gemäß Par. der Firma Danekamp aus Mail vom 01.07.2024 sowie der Bearbeitung von 01-08.07.2024	JS / A.L. / E.H.

Vermessung erstellt am / im 30/31.08.2022 durch:



Gemarkung: Halstenbek Flur: 5

Die Höhenangaben beziehen sich auf Höhen Bezugssystem DHHN2016.
Die Koordinaten beziehen sich auf ETRS89-UTM (Hamburg = System 310).

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein



A	Aktualisierung	Bauzeiten	11.03.2026	Kir./Kn.
Index	Art der Änderung	Datum	Zeichen	

d+p danekamp und partner
BERATENDE INGENIEURE VBI
Dipl.-Ing. Falk Derendorf · Dipl.-Ing. Wolfgang Kirsten · Dipl.-Ing. Wolfgang Nolte
Verbindungsweg 23 D 25469 Halstenbek Tel. 04101/6992-0 Fax 6992-99
E-Mail: info@danekamp.de Internet: www.danekamp.de

GW Gemeindewerke Halstenbek
Halstenbek

Mediansanierung
Moortwiete

Baumaßnahme	Anlage 2 Blatt 2 A
Mediansanierung	Übersichtslageplan Bauphasen
Bauherr	Moortwiete
Gemeindewerke Halstenbek	1:250
Osterschweg 9 25469 Halstenbek Tel.: 04101 - 497-0	Projekt Nr. GWH23005 Ausführungsplanung Datei A-GWH23005.dwg Blattgröße 0,45 m x 1,51 m = 0,67 m² bearbeitet: gezeichnet: geprüft: Apr. 2025 Kr. Apr. 2025 Pe. Apr. 2025 Kr.

Aufgestellt
Halstenbek, den
